



Peacebuilding

Sustaining Peace

Webinaire 5: Élaboration, suivi et évaluation (DM&E)

#GYPI 2017

28 juin 2017



Agenda – Webinar 5


- ◆ **Élaboration, suivi et évaluation (DM&E) du projet**
 - **En bref**
 - **Produits et résultats**
 - **Cadre de résultats (avec exemples)**
 - **Suivi**
 - **Évaluation**

- ◆ **Évaluation de l'ensemble de l'initiative**

- ◆ **Foire aux questions (FAQs)**



Élaboration, suivi et évaluation (DM&E) du projet

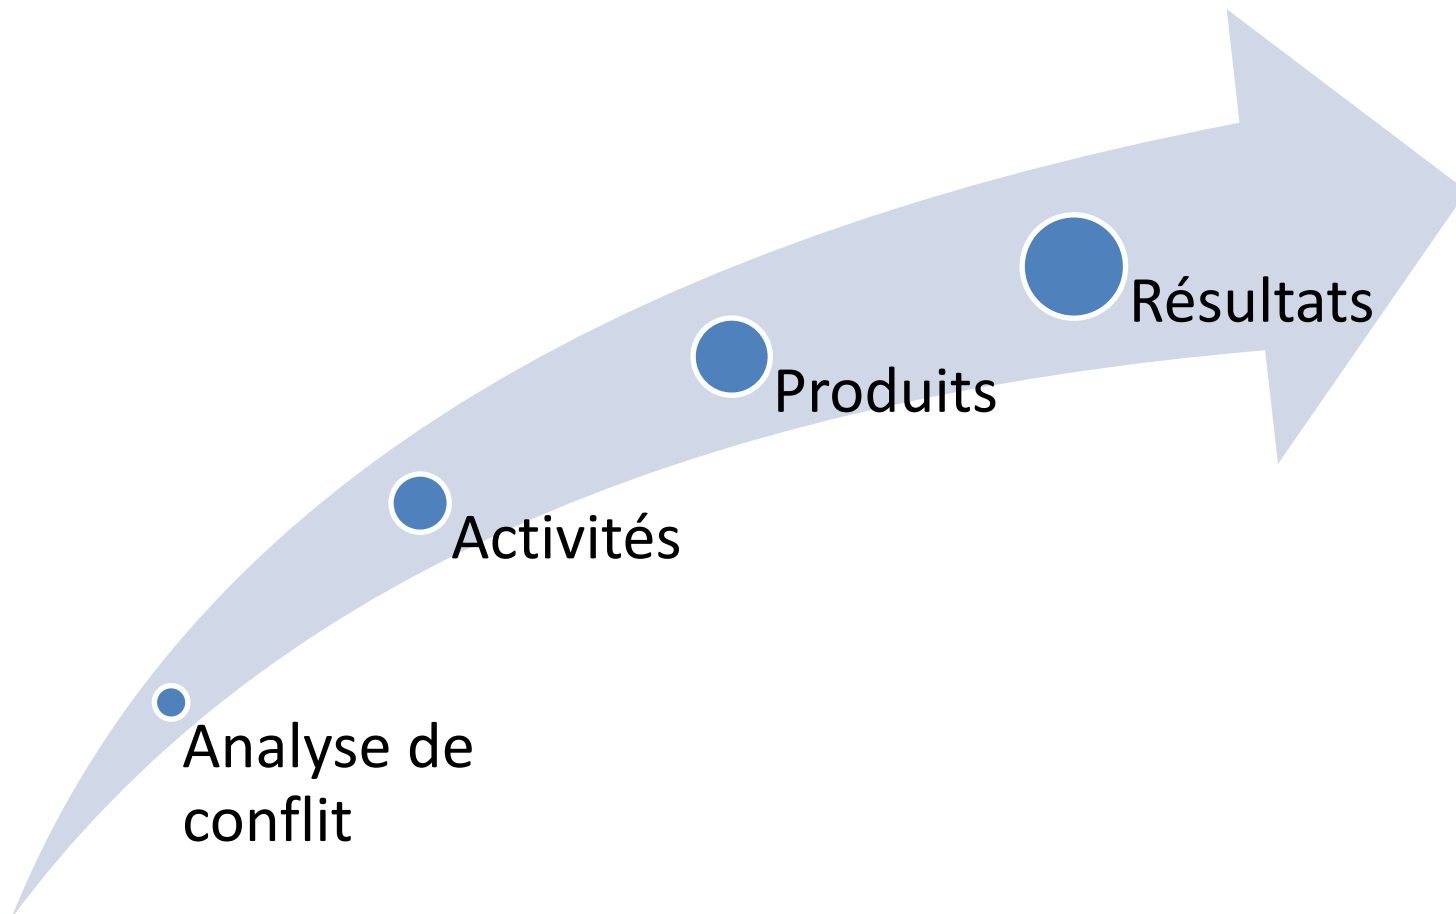



Produits

- Les produits sont les résultantes tangibles et immédiates d' une activité contribuant à atteindre un résultat
- Plusieurs produits contribuent à un résultat et plusieurs activités contribuent alors à générer des produits
- Dans la mise en œuvre d 'un projet, la réalisation d 'un produit est largement contrôlée



Résultats

- Le résultat est l' aboutissement désiré / changement généré par le projet
- Dans la mise en œuvre d 'un projet, vous vous engagez à réaliser un ou plusieurs résultats
- Toutefois, la réalisation d 'un résultat est moins contrôlable



Résultats

Les résultats d'un projet sont le(s) changement(s) positif(s) recherché(s). Ils doivent alors être ...

- définis comme le changement désiré
- définis au niveau approprié
- claires, réalistes et mesurables (\neq vagues)
- limités dans le temps
- ambitieux mais réalisables



Cadre de résultats

Le cadre de résultats...

- Est un résumé/une vue d' ensemble de votre projet
- Présente les composantes d' un programme (c.à.d., ce que vous avez l' intention d' effectuer) en séquences logiques
- Permet aux directeurs de projet de comprendre la dynamique de l' intervention et de détecter les éventuelles lacunes ou absences de logique



Cadre de résultats

Le cadre de résultats comprend (en général)...

- **Résultats**
- **Produits**
- [Activités]
- Indicateurs
- **Moyens de vérification**
- Niveaux de référence, cibles, étapes
- **Budgets par résultats, produits et/ou activités**



Cadre de résultats

- La définition des résultats doit s'articuler logiquement avec celles des produits
- Les sources d'information des moyens de vérification doivent être fiables
- Les niveaux de référence doivent être disponibles et les cibles doivent être ambitieuses mais réalisables
- Les étapes sont essentielles pour savoir si le projet est sur la bonne voie ou a dévié



Cadre de résultat: exemple

Résultat	Indicateur	Niveau de référence/ Cible	Étape
Les femmes et les filles provenant de milieux religieux conservateurs mettent en place et dirigent des initiatives visant la prévention de l'extrémisme violent dans leurs communautés	Indicateur 1: nombre de femmes et filles (ventilé par âge, ethnicité et communauté) ayant développé des initiatives financées par le projet.	Niveau de référence: 0 (2017) Cible: 40 (2018)	1 ^{er} Semestre: 20 2 ^{ème} Semestre: 40
	Indicateur 2: nombre de femmes et filles (ventilé par...) ayant participé à ces initiatives et faisant état d'un sentiment accru d'inclusion.	Niveau de référence: 0 (2017) Cible: 1200 (2018)	1 ^{er} Semestre: 300 2 ^{ème} Semestre: 850 3 ^{ème} Semestre: 1200



Cadre de résultats: exemple

Résultat	Indicateur	Niveau de référence/ Cible	Étape
Les femmes et les filles provenant de milieux religieux conservateurs mettent en place et dirigent des initiatives visant la prévention de l'extrémisme violent dans leurs communautés	Indicateur 1: nombre de femmes et filles (ventilé par âge, ethnicité et communauté) ayant développé des initiatives financées par le projet.	Niveau de référence: 0	1 st Semestre: 20
	Indicateur 2: nombre de femmes et filles (ventilé par...) ayant participé à ces initiatives et faisant état d'un sentiment accru d'inclusion.	Cible: 1200 (2018)	850 3 rd Semestre: 1200

Moyens de vérification:
Documentation des initiatives par directeur de projet; rapports/photos/ vidéos des activités de projet, etc.

Moyens de vérification:
Liste des participants; enquête sur la perception des participants au début et à la fin des activités du projet.



Cadre de résultats: exemple

Résultats	Indicateur	Niveau de référence/ Cible	Étape
Les femmes et les filles ont la connaissance et le sens de l'autonomie pour élaborer et diriger une initiative dans leur communauté sur la prévention de l'extrémisme violent.	Indicateur 1: Développement consultatif et participatif d'un module de formation adapté au contexte local.	Niveau de référence: 0 (2017) Cible: 1 (2018)	À la fin du troisième mois
	Indicateur 2: Nombre de femmes et filles formées sur la prévention de l'extrémisme violent, la direction d'initiatives et les droits des femmes.	Niveau de référence: 0 (2017) Cible: 60 (2018)	1 ^{er} Semestre: 40 2 ^{eme} Semestre: 60



Suivi du projet

Suivi et collecte de données

- Objectif double: gestion du projet et responsabilité
- Les données de référence doivent permettre de mesurer les progrès accomplis
- Il faut identifier les données disponibles et celles devant être collectées
- Une fois les niveaux de référence définis, le plan de collecte des données doit coïncider avec les rapports d' activités
- Compte tenu des échéances de mise en œuvre, la collecte de données spécifiques au projet n' est possible que pour les niveaux de référence et de finalité.



Évaluation au niveau du projet

- Tous les projets doivent prévoir d'effectuer et de financer une évaluation finale indépendante.
- Les évaluations de qualité s'appuient sur des données fiables et des comptes rendus réguliers durant la mise en œuvre du projet.
- Collaborer avec les secrétariats du PBSO and PBF pour définir les termes de référence, car les évaluations de consolidation de la paix sont plus compliquées que celles effectuées habituellement pour les projets de développement



Évaluation de l'ensemble de l'initiative

- L'initiative pour la promotion de l'égalité des sexes (GPI) s'inscrit à la suite de 4 initiatives précédentes; son évaluation viendra compléter les autres évaluations et recherches contribuant à une méta-évaluation globale sur l'égalité des sexes et la consolidation de la paix.
- Les projets de l'initiative pour la promotion des jeunes (YPI) feront aussi l'objet d'une méta-évaluation une fois les évaluations des projets individuels effectuées. Les résultats viendront s'ajouter au suivi continu de la mise en œuvre de la résolution 2250.



Peacebuilding
Sustaining Peace

Questions et réponses

www.pbfgyipi.org

pour davantage d'informations sur la GYPI concernant:

- **Processus, éligibilité et critères de sélection**
- **Ressources supplémentaires, y compris note d'orientation (ANG et FR) et enregistrements des webinaires**
- **Dépôt d'un dossier de candidature**

www.unpbf.org

Pour des informations générales sur le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF)
